ABLAUFPLAN

VORABZUG
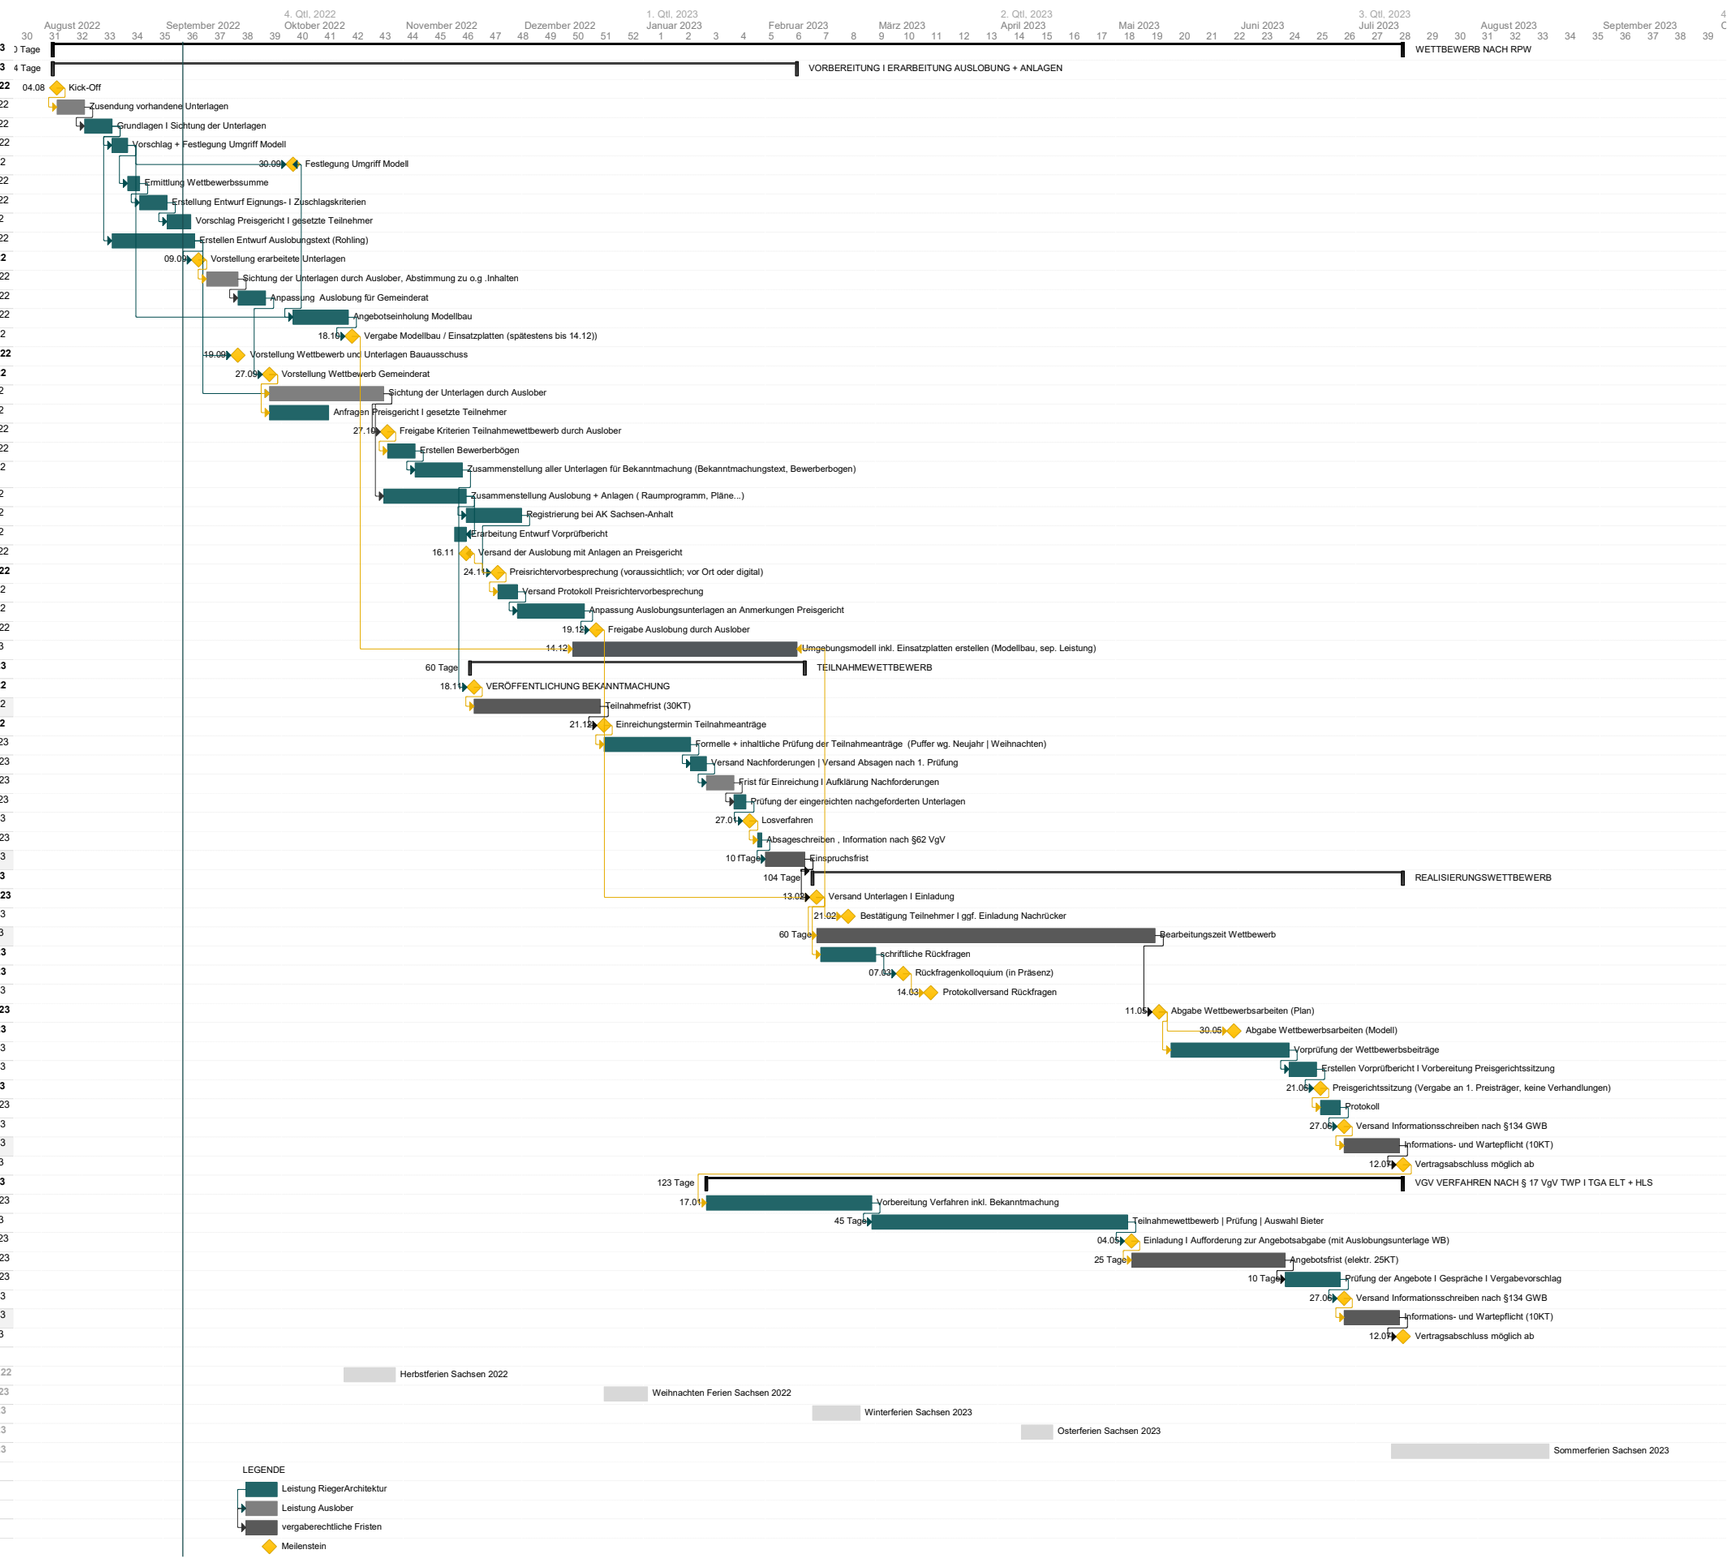
Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1 WETTBEWERB NACH RPW	**240 Tage**	**Don 04.08.22**	**Mit 12.07.23**
1.1 VORBEREITUNG I ERARBEITUNG AUSLOBUNG + ANLAGEN	**134 Tage**	**Don 04.08.22**	**Mit 08.02.23**
1.1.1 Kick-Off	**1 Tag**	**Don 04.08.22**	**Don 04.08.22**
1.1.2 Zusendung vorhandene Unterlagen	5 Tage	Fre 05.08.22	Don 11.08.22
1.1.3 Grundlagen I Sichtung der Unterlagen	5 Tage	Fre 12.08.22	Don 18.08.22
1.1.4 Vorschlag + Festlegung Umgriff Modell	2 Tage	Fre 19.08.22	Mon 22.08.22
1.1.5 Festlegung Umgriff Modell	1 Tag	Fre 30.09.22	Die 04.10.22
1.1.6 Ermittlung Wettbewerbssumme	3 Tage	Die 23.08.22	Don 25.08.22
1.1.7 Erstellung Entwurf Eignungs- I Zuschlagskriterien	5 Tage	Fre 26.08.22	Don 01.09.22
1.1.8 Vorschlag Preisgericht I gesetzte Teilnehmer	4 Tage	Fre 02.09.22	Mit 07.09.22
1.1.9 Erstellen Entwurf Auslobungstext (Rohling)	15 Tage	Fre 19.08.22	Don 08.09.22
1.1.10 Vorstellung erarbeitete Unterlagen	**1 Tag**	**Fre 09.09.22**	**Fre 09.09.22**
1.1.11 Sichtung der Unterlagen durch Auslober, Abstimmung zu o.g .Inhalten	7 Tage	Mon 12.09.22	Mon 19.09.22
1.1.12 Anpassung Auslobung für Gemeinderat	5 Tage	Die 20.09.22	Mon 26.09.22
1.1.13 Angebotseinholung Modellbau	10 Tage	Die 04.10.22	Mon 17.10.22
1.1.14 Vergabe Modellbau / Einsatzplatten (spätestens bis 14.12))	1 Tag	Die 18.10.22	Die 18.10.22
1.1.15 Vorstellung Wettbewerb und Unterlagen Bauausschuss	**1 Tag**	**Mon 19.09.22**	**Mon 19.09.22**
1.1.16 Vorstellung Wettbewerb Gemeinderat	**1 Tag**	**Die 27.09.22**	**Die 27.09.22**
1.1.17 Sichtung der Unterlagen durch Auslober	20 Tage	Mit 28.09.22	Mit 26.10.22
1.1.18 Anfragen Preisgericht I gesetzte Teilnehmer	10 Tage	Mit 28.09.22	Mit 12.10.22
1.1.19 Freigabe Kriterien Teilnahmewettbewerb durch Auslober	1 Tag	Don 27.10.22	Don 27.10.22
1.1.20 Erstellen Bewerberbögen	5 Tage	Fre 28.10.22	Don 03.11.22
1.1.21 Zusammenstellung aller Unterlagen für Bekanntmachung (Bekanntmachungstext, Bewerberbogen)	8 Tage	Fre 04.11.22	Die 15.11.22
1.1.22 Zusammenstellung Auslobung + Anlagen (Raumprogramm, Pläne...)	15 Tage	Don 27.10.22	Mit 16.11.22
1.1.23 Registrierung bei AK Sachsen-Anhalt	10 Tage	Don 17.11.22	Mit 30.11.22
1.1.24 Erarbeitung Entwurf Vorprüfbericht	3 Tage	Mon 14.11.22	Mit 16.11.22
1.1.25 Versand der Auslobung mit Anlagen an Preisgericht	1 Tag	Mit 16.11.22	Don 17.11.22
1.1.26 Preisrichtervorbesprechung (voraussichtlich; vor Ort oder digital)	**1 Tag**	**Don 24.11.22**	**Don 24.11.22**
1.1.27 Versand Protokoll Preisrichtervorbesprechung	3 Tage	Fre 25.11.22	Die 29.11.22
1.1.28 Anpassung Auslobungsunterlagen an Anmerkungen Preisgericht	13 Tage	Mit 30.11.22	Fre 16.12.22
1.1.29 Freigabe Auslobung durch Auslober	1 Tag	Mon 19.12.22	Mon 19.12.22
1.1.30 Umgebungsmodell inkl. Einsatzplatten erstellen (Modellbau, sep. Leistung)	40 Tage	Mit 14.12.22	Mit 08.02.23
1.2 TEILNAHMEWETTBEWERB	**60 Tage**	**Fre 18.11.22**	**Fre 10.02.23**
1.2.1 VERÖFFENTLICHUNG BEKANNTMACHUNG	**1 Tag**	**Fre 18.11.22**	**Fre 18.11.22**
1.2.2 Teilnahmefrist (30KT)	32 fTage	Fre 18.11.22	Die 20.12.22
1.2.3 Einreichungstermin Teilnahmeanträge	**1 Tag**	**Mit 21.12.22**	**Mit 21.12.22**
1.2.4 Formelle + inhaltliche Prüfung der Teilnahmeanträge (Puffer wg. Neujahr | Weihna	15 Tage	Don 22.12.22	Don 12.01.23
1.2.5 Versand Nachforderungen | Versand Absagen nach 1. Prüfung	2 Tage	Fre 13.01.23	Mon 16.01.23
1.2.6 Frist für Einreichung I Aufklärung Nachforderungen	7 fTage	Mon 16.01.23	Mon 23.01.23
1.2.7 Prüfung der eingereichten nachgeforderten Unterlagen	3 Tage	Die 24.01.23	Don 26.01.23
1.2.8 Losverfahren	1 Tag	Fre 27.01.23	Fre 27.01.23
1.2.9 Absageschreiben , Information nach §62 VgV	1 Tag	Mon 30.01.23	Mon 30.01.23
1.2.10 Einspruchsfrist	10 fTage	Die 31.01.23	Fre 10.02.23
1.3 REALISIERUNGSWETTBEWERB	**104 Tage**	**Mon 13.02.23**	**Mit 12.07.23**
1.3.1 Versand Unterlagen I Einladung	**1 Tag**	**Mon 13.02.23**	**Mon 13.02.23**
1.3.2 Bestätigung Teilnehmer I ggf. Einladung Nachrücker	1 Tag	Die 21.02.23	Die 21.02.23
1.3.3 Bearbeitungszeit Wettbewerb	60 Tage	Die 14.02.23	Mit 10.05.23
1.3.4 schriftliche Rückfragen	**10 Tage**	**Mit 15.02.23**	**Die 28.02.23**
1.3.5 Rückfragenkolloquium (in Präsenz)	1 Tag	**Die 07.03.23**	**Die 07.03.23**
1.3.6 Protokollversand Rückfragen	1 Tag	Die 14.03.23	Die 14.03.23
1.3.7 Abgabe Wettbewerbsarbeiten (Plan)	**1 Tag**	**Don 11.05.23**	**Don 11.05.23**
1.3.8 Abgabe Wettbewerbsarbeiten (Modell)	**1 Tag**	**Die 30.05.23**	**Die 30.05.23**
1.3.9 Vorprüfung der Wettbewerbsbeiträge	20 Tage	Mon 15.05.23	Die 13.06.23
1.3.10 Erstellen Vorprüfbericht I Vorbereitung Preisgerichtssitzung	5 Tage	Mit 14.06.23	Die 20.06.23
1.3.11 Preisgerichtssitzung (Vergabe an 1. Preisträger, keine Verhandlungen)	**1 Tag**	**Mit 21.06.23**	**Mit 21.06.23**
1.3.12 Protokoll	3 Tage	Don 22.06.23	Mon 26.06.23
1.3.13 Versand Informationsschreiben nach §134 GWB	1 Tag	Die 27.06.23	Die 27.06.23
1.3.14 Informations- und Wartepflicht (10KT)	10 Tage	Mit 28.06.23	Die 11.07.23
1.3.15 Vertragsabschluss möglich ab	1 Tag	Mit 12.07.23	Mit 12.07.23
1.4 VGV VERFAHREN NACH § 17 VgV TWP I TGA ELT + HLS	**123 Tage**	**Die 17.01.23**	**Mit 12.07.23**
1.4.1 Vorbereitung Verfahren inkl. Bekanntmachung	30 Tage	Die 17.01.23	Mon 27.02.23
1.4.2 Teilnahmewettbewerb | Prüfung | Auswahl Bieter	45 Tage	Die 28.02.23	Mit 03.05.23
1.4.3 Einladung I Aufforderung zur Angebotsabgabe (mit Auslobungsunterlage WB)	1 Tag	Don 04.05.23	Don 04.05.23
1.4.4 Angebotsfrist (elektr. 25KT)	25 Tage	Fre 05.05.23	Mon 12.06.23
1.4.5 Prüfung der Angebote I Gespräche I Vergabevorschlag	10 Tage	Die 13.06.23	Mon 26.06.23
1.4.6 Versand Informationsschreiben nach §134 GWB	1 Tag	Die 27.06.23	Die 27.06.23
1.4.7 Informations- und Wartepflicht (10KT)	10 Tage	Mit 28.06.23	Die 11.07.23
1.4.8 Vertragsabschluss möglich ab	1 Tag	Mit 12.07.23	Mit 12.07.23
3 Herbstferien Sachsen 2022	11 Tage	Mon 17.10.22	Sam 29.10.22
4 Weihnachten Ferien Sachsen 2022	6 Tage	Don 22.12.22	Son 01.01.23
5 Winterferien Sachsen 2023	10 Tage	Mon 13.02.23	Fre 24.02.23
6 Osterferien Sachsen 2023	5 Tage	Fre 07.04.23	Fre 14.04.23
7 Sommerferien Sachsen 2023	30 Tage	Mon 10.07.23	Fre 18.08.23
